

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 58-93-43
E-mail: mail@ulgov.ru. http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП 7325001144/732501001

14.12.2018 № 51-П/17

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ульяновской области

10 дека 2018 года
С.И.Морозов

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Жильё»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жильё		
Краткое наименование регионального проекта	Жильё	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	С.Н.Колесова, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	С.А.Шканов, Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	М.С.Жданович, начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»		
Связь с государственными программами Ульяновской области	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710; Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. № 37/412-П; Государственная программа Ульяновской области «Социальная защита и поддержка населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. №37/408-П.		

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Цель: увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 1 млн. квадратных метров в год в том числе за счёт:

- привлечения субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;
- содействия по вовлечению в оборот федеральных земель в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Общий ввод жилья на территории Ульяновской области, млн. кв.метров	Основной	0,976	01.01.2018	0,983	0,986	0,990	0,993	0,996	1
Ввод жилья в многоквартирных жилых домах, млн кв. метров										
2.	Ввод жилья в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области, млн кв. метров	Дополнительный	0,281	01.01.2018	0,282	0,283	0,284	0,285	0,286	0,287
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн кв. метров										
3.	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов	Основной	0,143	01.01.2018	0,053	*	*	*	*	*

	Российской Федерации (на территории Ульяновской области), млн кв. метров									
Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн кв. метров										
4.	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства на территории Ульяновской области, млн кв. метров	Дополнительный	1,042	01.01.2018	0,844	0,784	0,336	0,027	**	**
5.	Количество земельных участков предоставленных для целей жилищного строительства на территории Ульяновской области, шт.	Дополнительный	291	01.01.2018	753	759	781	753	779	794
6.	Площадь земельных участков, предоставленных для целей жилищного строительства на территории Ульяновской области, тыс. га	Дополнительный	0,0011	01.01.2018	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

* Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

** Приведены данные по выданным разрешениям на строительство многоквартирных жилых домов. Показатель подлежит ежегодной актуализации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результата	срок	Характеристика результата
1.	Выполнение индикативных показателей по вводу жилья		
1.1.	Утверждение директивного плана по вводу в эксплуатацию жилых помещений	15.02.2019 Далее ежегодно	Утверждены индивидуальные показатели по вводу в эксплуатацию жилых помещений для каждого муниципального образования
1.2.	Взаимодействие с администрациями муниципальных образований Ульяновской области в части исполнения ими ежегодных индикативных показателей по вводу в эксплуатацию жилых помещений	31.12.2019 Далее ежегодно	Ежегодные индикативные показатели по вводу жилья на территории Ульяновской области выполняются.
1.3.	Оказание содействия компаниям – застройщикам в реализации проектов комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области	На заявительной основе	Разрешение проблемных вопросов застройщиков
<p style="text-align: center;">Задача национального проекта: <i>Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья</i></p>			
2	<p>Результат федерального проекта: <i>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Выделены средства федерального бюджета на финансирование соответствующих мероприятий</i></p> <p>Срок: <i>31.10.2018 (далее ежегодно)</i></p>		

2.1	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области	31.12.2019 Далее - ежегодно	Выделены средства федерального бюджета на финансирование соответствующих мероприятий
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Утверждён перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Утверждён перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.</i></p> <p>Срок: <i>31.12.2018 (далее - ежегодно)</i></p>		
3.1	Утверждение перечня проектов для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области	31.12.2019 Далее - ежегодно	Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между проектами на территории Ульяновской области
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории.</i></p> <p>Срок: <i>31.12.2018 (далее - ежегодно)</i></p>		
4.1	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области	01.02.2020 Далее - ежегодно	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории
5..	<p>Результат федерального проекта: <i>Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения условий финансирования мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Внесены изменения в Приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710</i></p> <p>Срок: <i>01.02.2019</i></p>		

5.1.	Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством	31.12.2019 Далее ежегодно	Внесены изменения в государственную программу «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Задача национального проекта: <i>снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства</i>			
6.	<p>Результат федерального проекта: <i>Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней</i></p> <p>Срок: <i>31.12.2021</i></p>		
6.1	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	31.12.2021	Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 7 рабочих дней или менее
Задача национального проекта: <i>Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение</i>			
7.1	Образованы и предоставлены земельные участки, находящиеся в собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства	Постоянно	Заклучены договоры аренды, договоры купли-продажи земельных участков для целей жилищного строительства общей площадью 30 га
8.	<p>Результат федерального проекта: <i>Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)»</i></p> <p>Срок: <i>31.12.2018</i></p>		

8.1.	Изъятые и вовлечены в оборот неиспользуемые или неэффективно используемые земельные участки, находящиеся в собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства	Постоянно	Проведены контрольные мероприятия в отношении неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков для целей жилищного строительства
<i>Задача национального проекта: Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей</i>			
9.	<p>Результат федерального проекта: <i>Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильём 125 тыс. семей граждан</i></p> <p>Срок: <i>01.04.2019 (далее-ежегодно)</i></p>		
9.1	Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей	01.04.2019 Далее - ежегодно	Предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильём 250 одиноко проживающим гражданам и семьям *

* Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильём, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Результат федерального проекта: <i>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.</i>							
2.1.	на реализацию мероприятий по стимулированию программы развития жилищного строительства Ульяновской области	309,4	*	*	*	*	*	309,4*
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области)	253,7	*	*	*	*	*	253,7*
2.1.2.	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:	55,7	*	*	*	*	*	55,7*
2.1.2.1.	бюджет Ульяновской области	55,7	*	*	*	*	*	55,7
2.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области)	0	*	*	*	*	*	0
9.	Результат федерального проекта: <i>Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей.</i>							
9.1.	на реализацию мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий гражданам Ульяновской области, в том числе:	218,6	201,2	168,5	168,5	168,5	168,5	1093,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области)	94,7	89,3	56,6	56,6	56,6	56,6	410,4
9.1.2.	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:	123,9	111,9	111,9	111,9	111,9	111,9	683,4
9.1.2.1.	бюджет Ульяновской области	116,3	111,9	111,9	111,9	111,9	111,9	675,8
9.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области)	7,6	-	-	-	-	-	7,6
Всего по региональному проекту, в том числе:		528	201,2	168,5	168,5	168,5	168,5	1403,2*
федеральный бюджет		348,4	89,3	56,6	56,6	56,6	56,6	664,1*
консолидированный бюджет Ульяновской области		179,6	111,9	111,9	111,9	111,9	111,9	739,1*
бюджет Ульяновской области		172	111,9	111,9	111,9	111,9	111,9	731,5
бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области)		7,6	-	-	-	-	-	7,6

* Финансирование устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	60 %
2.	Администратор проекта	М.С.Жданович	Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	Д.А.Полежаев, начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	60 %
Общие организационные мероприятия по проекту.					
3.	Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту	Д.А.Полежаев	Начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	В.В.Дуняк, заместитель директора по жилищному строительству ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	60 %
Утверждение директивного плана по вводу в эксплуатацию жилых помещений					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	60%
5.	Участник проекта	Д.А.Полежаев	Начальник управления жилищного строительства ОГКУ	В.В.Дуняк, заместитель директора по жилищному строительству ОГКУ	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			«Ульяновскоблстройзаказчик»	«Ульяновскоблстройзаказчик»	
6.	Участник проекта	М.С.Жданович	Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	Д.А.Полежаев, начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	50 %
Взаимодействие с администрациями муниципальных образований Ульяновской области в части исполнения ими ежегодных индикативных показателей по вводу в эксплуатацию жилых помещений					
7.	Ответственный за достижение результата проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	50%
8.	Участник проекта	Д.А.Полежаев	Начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	В.В.Дуняк, заместитель директора по жилищному строительству ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	50%
9.	Участник проекта	М.С.Жданович	Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	Д.А.Полежаев, начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	50%
Оказание содействия компаниям-застройщикам в реализации проектов комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области					
10.	Ответственный за достижение	С.М.Жигалова	Заместитель директора департамента строительства	И.Ю.Лукьянов, исполняющий обязанности директора	50%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата проекта		Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	
11.	Участник проекта	Д.А.Полежаев	Начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	В.В.Дуняк, заместитель директора по жилищному строительству ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	40%
12.	Участник проекта	М.С.Жданович	Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	Д.А.Полежаев, начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	40%
Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области					
13.	Ответственный за достижение результата проекта	Д.А.Вавинин	Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	А.А.Смекалин, Председатель Правительства Ульяновской области	30%
14.	Участник проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	50%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник проекта	В.А.Шамшина	Директор департамента финансового и административного обеспечения- главный бухгалтер Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	20%
16.	Участник проекта	Н.Н.Челокиди	Начальник отдела планирования расходов производственной сферы департамента отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области	С.Ф.Егупов, заместитель директора департамента отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области	10 %
17.	Участник проекта	С.С.Панчин	Глава муниципального образования «город Ульяновск»	С.И.Морозов, Губернатор Ульяновской области	10%
18.	Участник проекта	С.А.Выжимов	Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «город Димитровград»	С.И.Морозов, Губернатор Ульяновской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с требованиями федерального законодательства					
19.	Ответственный за достижение результата проекта	А.А.Пикусев	Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	30 %
20.	Участник проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	20 %
21.	Участник проекта	О.Н.Клевогина	Референт департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	С.М.Жигалова, заместитель директора департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	20 %
22.	Участник проекта	В.А.Шамшина	Директор департамента финансового и административного обеспечения- главный бухгалтер Министерства промышленности,	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области		
23.	Участник проекта	Н.Н.Челокиди	Начальник отдела планирования расходов производственной сферы департамента отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области	С.Ф.Егупов, заместитель директора департамента отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области	10 %
Утверждён перечень проектов для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области					
24.	Ответственный за достижение результата проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	40 %
25.	Участник проекта	О.Н.Клевогина	Референт департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	С.М.Жигалова, заместитель директора департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Ульяновской области					
26.	Ответственный за достижение результата проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	40 %
27.	Участник проекта	О.Н.Клевогина	Референт департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	С.М.Жигалова, заместитель директора департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	10 %
28.	Участник проекта	А.А.Пикусев	Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	10 %
29.	Участник проекта	С.С.Панчин	Глава муниципального образования «город Ульяновск»	С.И.Морозов, Губернатор Ульяновской области	10%
30.	Участник проекта	С.А.Выжимов	Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «город Димитровград»	С.И.Морозов, Губернатор Ульяновской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник проекта	Д.А.Полежаев	Начальник управления жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	В.В.Дуняк, заместитель директора по жилищному строительству ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	50%
Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»					
32.	Ответственный за достижение результата проекта	С.А.Тюрина	Исполняющий обязанности руководителя Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области	С.Н.Колесова, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области	40 %
33.	Участник проекта	Р.Б.Валюткин	Директор ОГАУ «Градцентр»	С.А.Тюрина, Исполняющий обязанности руководителя Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области	20%
Образованы и предоставлены земельные участки, находящиеся в собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства					
34.	Ответственный за достижение результата	С.М.Мишин	Заместитель руководителя Агентства государственного имущества и земельных	Г.В.Неробеев, Руководитель Агентства государственного имущества и земельных	30 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		отношений Ульяновской области	отношений Ульяновской области	
35.	Участник проекта	А.Н.Таушкин	Директор областного государственного казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный информационный центр»	Г.В.Неробеев, Руководитель Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	30 %
36.	Участник проекта	М.К.Архипова	Начальник управления муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области	О.В.Никитенко, Заместитель Губернатора Ульяновской области	30%
Изъятые и вовлечены в оборот неиспользуемые или неэффективно используемые земельные участки, находящиеся в собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства					
37.	Ответственный за достижение результата проекта	С.М.Мишин	Заместитель руководителя Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	Г.В.Неробеев, Руководитель Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	30 %
38.	Участник проекта	А.Н.Таушкин	Директор областного государственного казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный информационный центр»	Г.В.Неробеев, Руководитель Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	30 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник проекта	М.К.Архипова	Начальник управления муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области	О.В.Никитенко, Заместитель Губернатора Ульяновской области	30%
Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Ульяновской области по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей					
40.	Ответственный за достижение результата проекта	С.А.Шканов	Заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин, Министр промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	40 %
41.	Участник проекта	А.А.Адонин	Директор департамента развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	С.В.Панченко, Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	30%
42.	Участник проекта	Б.И.Чернов	Референт департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и	С.М.Жигалова, заместитель директора департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			транспорта Ульяновской области	комплекса и транспорта Ульяновской области	
43.	Участник проекта	Т.П.Удовенко	Главный специалист департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	С.М.Жигалова, заместитель директора департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области	20%

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стимулирование внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве

Актуальность ускоренного внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве обусловлена изменяющимися предпочтениями потребителей строительной продукции.

Наличие современных нормативных требований в строительстве позволит обеспечить структурные изменения на предприятиях промышленности строительных материалов, включая автоматизацию технологических процессов и создать конкурентные преимущества для развития рынка промышленности строительных материалов.

Сдерживающим фактором ускоренного внедрения инновационной строительной продукции является отсутствие на нее национальных стандартов, процедура разработки которых занимает от одного года до нескольких лет.

В этой связи, наиболее результативным механизмом поддержки, станет совершенствование процедуры оценки пригодности для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативно техническими документами. В настоящее время количество заявок, поступающих в Минстрой России на внедрение новых материалов в строительстве составляет не более 300 единиц ежегодно. Стимулирование производителей через расширение номенклатуры продукции, подлежащей оценке пригодности в отсутствии стандартов и сводов правил позволит значительно сократить время на внедрение инновационных строительных материалов (до трех месяцев), а также создать благоприятные условия для устранения

технических барьеров при внедрении в строительстве прогрессивных отечественных и зарубежных достижений.

Развитие номенклатуры производства строительных материалов и открытие новых производств позволит вводить необходимый объем жилищного строительства.

Предложения по динамике сокращения административных процедур к 2024 году, в том числе при реализации принципа «одного окна»

Этап 1 - июнь 2019 г. – автоматизировано 5 процедур;

Этап 2 - июль 2019 – декабрь 2019 – автоматизировано – 8 процедур;

Этап 3 - январь 2020 – июнь 2020 – автоматизировано – 15 процедур;


Этап 4 - июль 2020 – декабрь 2020 – автоматизировано – 9 процедур;

Этап 5 - январь 2021 – июнь 2021 – автоматизировано – 33 процедуры;

Этап 6 - июль 2021 – декабрь 2021 – автоматизировано – 7 процедур;

Этап 7- январь 2022 – июнь 2022 – автоматизировано – 19 процедур.

Куратор проекта –
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

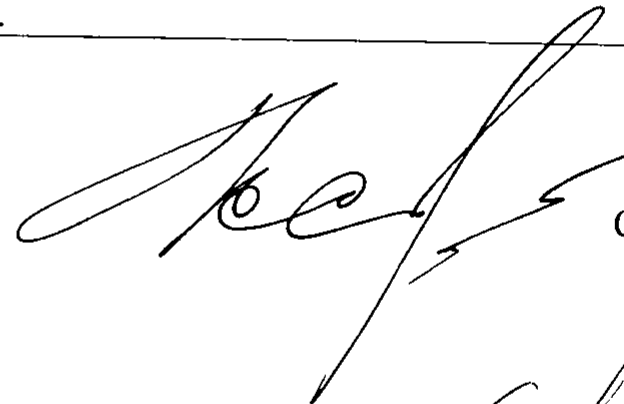

С.Н.Колесова

Руководитель проекта –
заместитель Министра промышленности, строительства,
жилищно – коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области



С.А.Шканов
